

**Mejoramiento Camino Rural Aldea Los Lochuyes hacia Caserío La Ciénega El Chol,
Baja Verapaz**

Dirección Municipal de Planificación

Departamento de Baja Verapaz, El Chol

Estudio de Pre-factibilidad

Municipalidad de Santa Cruz El Chol, Baja Verapaz

Marzo de 2021

Contenido

Diagnóstico.....	5
Antecedentes.....	5
Identificación de la Problemática	6
Caracterización del Área de Influencia	8
<i>Descripción Geográfica</i>	8
Macro-localización	9
Micro-Localización	9
<i>Caracterización Socioeconómica</i>	10
<i>Organizaciones Comunales</i>	11
<i>Caracterización Económica</i>	11
<i>Servicios existentes</i>	12
Justificación del Proyecto.....	13
Situación con Proyecto:	13
Situación sin Proyecto	13
Análisis de Alternativas.....	15
Identificación de Alternativas.....	15
Alternativa Seleccionada	24
Formulación del Proyecto.....	25
Descripción del Proyecto.....	25
Objetivos del Proyecto.....	25
Metas o Resultados.....	25
Estudio de Mercado	26
Precio	26
Demanda.....	26
Demanda Vehicular:	27

Oferta:.....	28
Oferta ante Aforo Vehicular	29
Balance Demanda-Oferta	30
Balance oferta y demanda ante aforo vehicular.....	30
Ingresos por servicios prestados	30
Estudio Técnico	31
Localización.....	31
Micro-Localización	32
Tamaño	32
Ingeniería y Tecnología	33
Cronograma de Ejecución Física	33
Cronograma de Ejecución Financiera.....	33
Presupuesto.....	34
Financiamiento	34
Actividades de cierre de Proyecto	34
Estudio Administrativo.....	35
Operación y Mantenimiento	35
Pavimentos Rígidos	35
Mantenimiento Preventivo	36
Mantenimiento Periódico	36
Mantenimiento Rutinario.....	36
Mantenimiento Correctivo.....	36
Limpieza de elementos de seguridad vertical existente.....	36
Sellado de juntas, fisuras y grietas de concreto hidráulico.....	37
Administración:	39

Mantenimiento y vida útil.....	39
Estudio Legal.....	40
Documentos Socio-legales:	40
Documentación Legal durante su ejecución (contratación y ejecución):	40
Documentación Legal durante su operación y mantenimiento:	40
Estudio Ambiental	41
Medidas de Mitigación Ambiental (ejecución)	41
Estudio Financiero.....	42
Presupuesto de Ejecución	42
Presupuesto de Pre-Inversión	42
Presupuesto de Operación y Mantenimiento	42
Valor Actual del Costo	43
Costo Anual Equivalente	44

Diagnóstico

Antecedentes

La periodicidad del mantenimiento vial sucede con poca frecuencia por parte de autoridades gubernamentales, debido a ello las comunidades realizan de forma recurrente trabajos de bacheo sin compactación provocando en época de invierno el deterioro frecuente de la misma.

En el presupuesto municipal en los últimos cinco años se incluyen proyectos de “Conservación De Carretera Hacia Las Comunidades Rurales Y Urbanas Del Municipio”, que permite realizar trabajos en las carreteras; el mantenimiento sucede tres veces al año, dos en época de verano y una en época de invierno.

Las inversiones en infraestructura vial por parte de la Municipalidad se han orientado en los últimos años principalmente al mantenimiento de los caminos, calles y carreteras pero la inversión en mejorar la infraestructura vial ha sido poco o nula en algunos años.

Para mejorar la infraestructura vial en el municipio y considerando la topografía de las carreteras que en su mayoría están en pendientes de 25% a 30% se han realizado cambios en la carpeta de rodadura, utilizando pavimento de concreto para asegurar la vida útil de la carretera por 10 años como mínimo.

Ha existido nula inversión en el mejoramiento de la infraestructura vial en el municipio por parte de dependencias estatales ajenas a la Municipalidad.

Las problemáticas municipales no ahondan en la red vial, debido a que se identifica como causa del bajo poder adquisitivo en el municipio, esto orienta la inversión hacia otros sectores.

El camino que conduce a la comunidad es transitado por los pobladores de seis comunidades que día a día que se conducen hacia el área urbana del municipio.

Han existido varias solicitudes por parte del Consejo Comunitario de Desarrollo, principalmente de forma verbal ante las autoridades municipales, solicitando la motoniveladora para el mantenimiento frecuente de la calle en el centro de la comunidad.

El costo en fletes para la movilización de mercadería como materiales de construcción, materiales de agricultura y artículos de tienda es elevado para los comunitarios, con un costo de 1 quetzal por kilómetro recorrido.

El Consejo de Desarrollo Comunitario COCODE en Asamblea General priorizaron el proyecto mejoramiento camino Rural de Aldea Los Lochuyes hacia Caserío La Ciénega, para ser presentado durante la reprogramación de la propuesta de inversión 2021 por parte del Consejo Municipal de Desarrollo COMUDE.


La comunidad cuenta con dos rutas hacia la centralidad del municipio, pero resulta ser la ruta de caserío La Ciénega, donde se concentra parte de las actividades de agricultura y ganadería, así como también el cementerio de la comunidad, motivo por el cual el proyecto ha sido presentado ante el Consejo Municipal de Desarrollo en más de una ocasión, no siendo priorizado por dicho Consejo hasta el año 2020 cuando se realizó la priorización para el ejercicio fiscal 2021.

Identificación de la Problemática


En el municipio de Santa Cruz el Chol el 85% de la infraestructura vial que corresponde a 82.45 kilómetros se encuentra en mal estado, esto causado por el deterioro tanto en calles como en caminos rurales, la escorrentía de lluvia, el alto crecimiento de circulación vial en transporte liviano como en transporte pesado y el bloqueo de cunetas por residuos sólidos contribuyen a que los habitantes de comunidades rurales presenten dificultades en el desplazamiento hacia las centralidades del municipio, los vehículos se deterioren y tengan que ser revisados por servicios correctivos con demasiada frecuencia, esto representa aumento en el gasto tanto para propietarios de vehículos particulares como para vehículos que transportan a terceros, generando un costo en ambos, además los tiempos de movilidad en el desplazamiento por kilómetro resultan ser bastante lentos promediando los 15 kilómetros por hora.

Este retraso en el desplazamiento genera que el desarrollo económico para productores y comercializadores sea bastante lento, disminuyendo con ello la igualdad en el desarrollo socioeconómico de las familias.

Árbol de Problemas

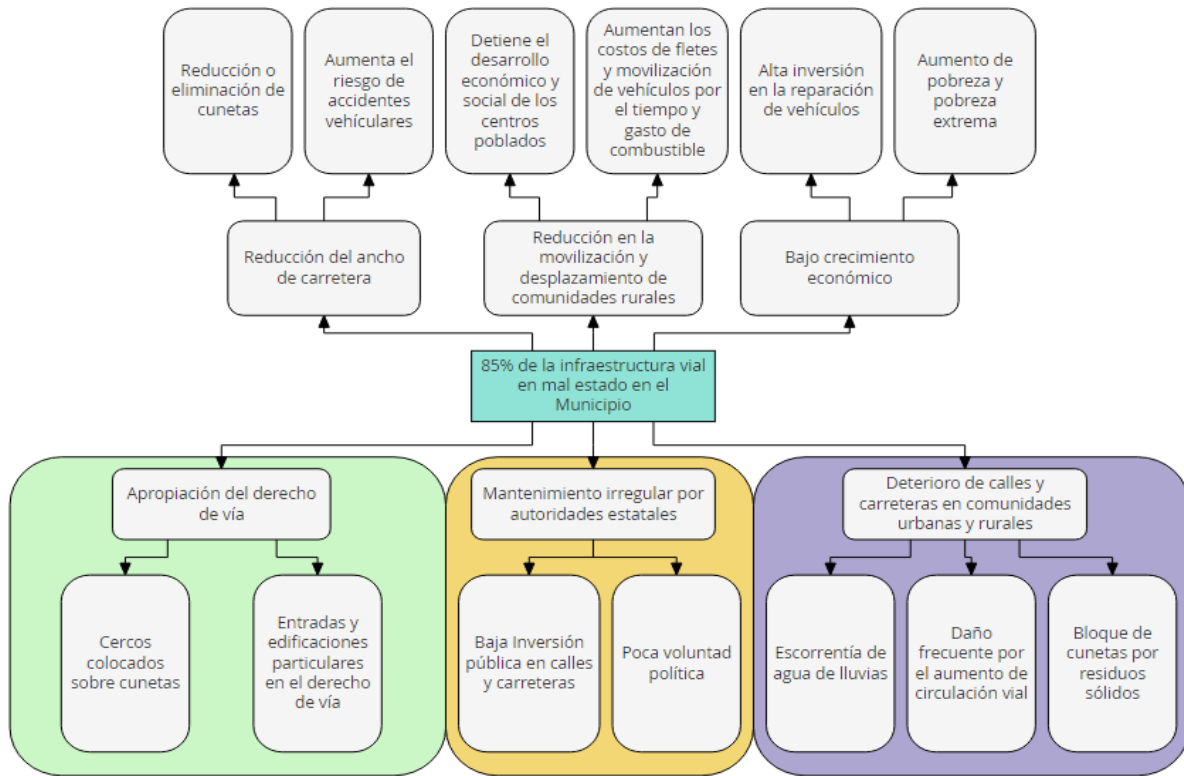

Árbol de Objetivos

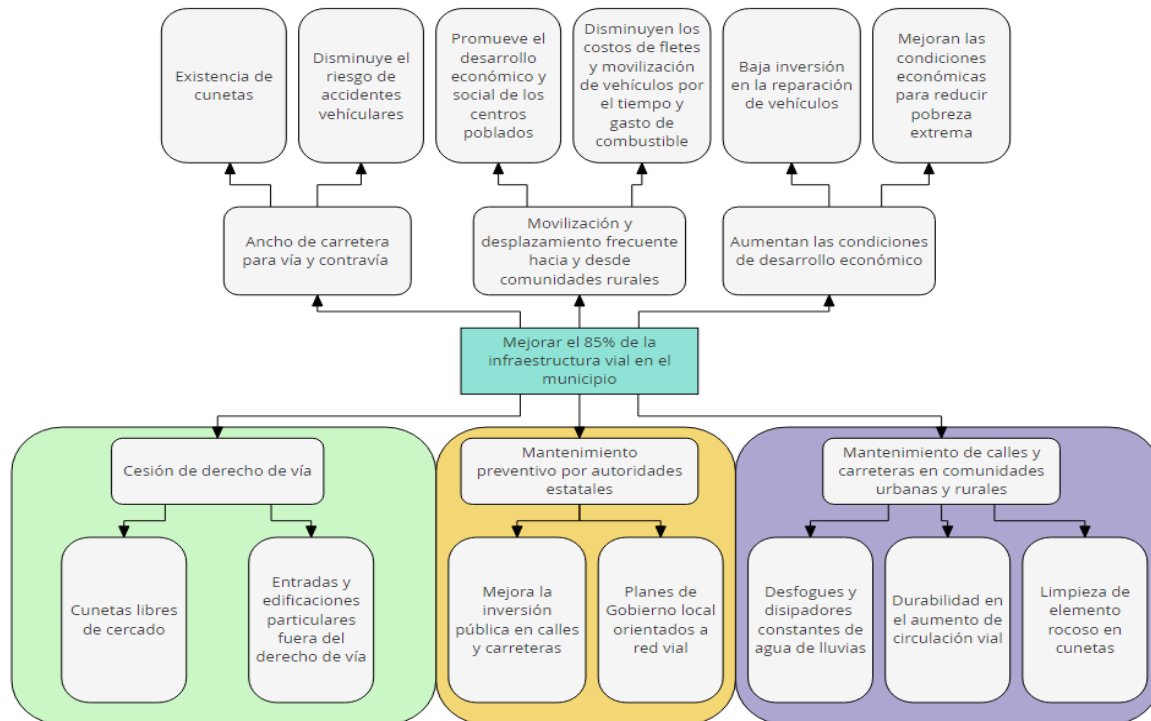

Caracterización del Área de Influencia


La comunidad de Aldea Los Lochuyes se encuentra a 6 kilómetros del Casco Urbano del municipio y tiene la categoría de Caserío. El centro se encuentra a 1,030 metros sobre el nivel del mar (según el Instituto Geográfico Nacional).

Según Simmons (1959) los suelos del municipio se clasifican como suelos de la serie Acasaguastlan,(Ac), marajuma, (Mj), Salama (Sl) y Chol (chg), los suelos superficiales son de una textura franco arenoso fina que indica un drenaje interno (filtración del agua o permeabilidad) rápido, un promedio de 10 cm. de profundidad. La profundidad efectiva de los suelos para cultivos es aproximadamente 10 cm y difícilmente supera esta medida, los suelos se encuentran con un alto porcentaje de pedregosidad, tanto superficialmente como en el subsuelo, compuesta por rocas metamórficas (rocas muy duras) y sedimentarias (presencia de cal), las pendientes topográficas en la región son muy pronunciadas entre un 30 a 40% de pendiente. La vocación de estos suelos es forestal de protección, el lugar es propenso a sequillas, dado que se encuentra dentro de la zona conocida como corredor seco, a orillas del río Motagua.


Descripción Geográfica

La topografía del terreno es quebrada con una inclinación en varios puntos de la comunidad superior a los 35° al igual que todo el municipio. Limita al norte con Aldea El Apazotec, al sur con Caserío San Isidro, al este con Municipio de Salamá y al oeste con Área Urbana. Las coordenadas son las siguientes: 14°55'47.10" N y 90°28'44.4" O.

Macro-localización

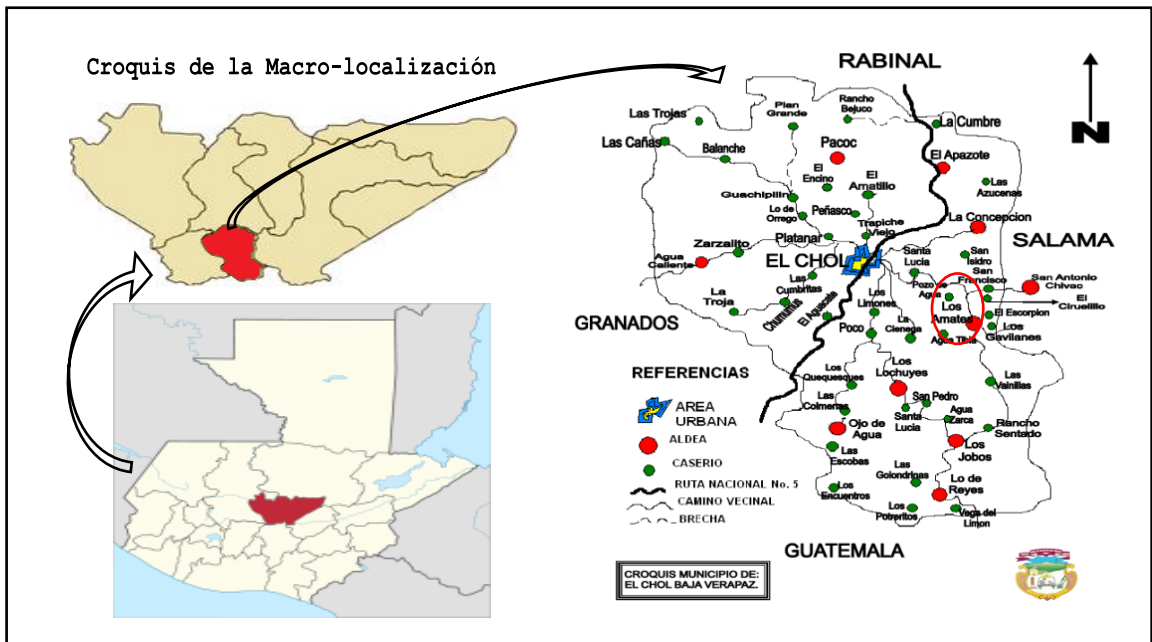

Micro-Localización

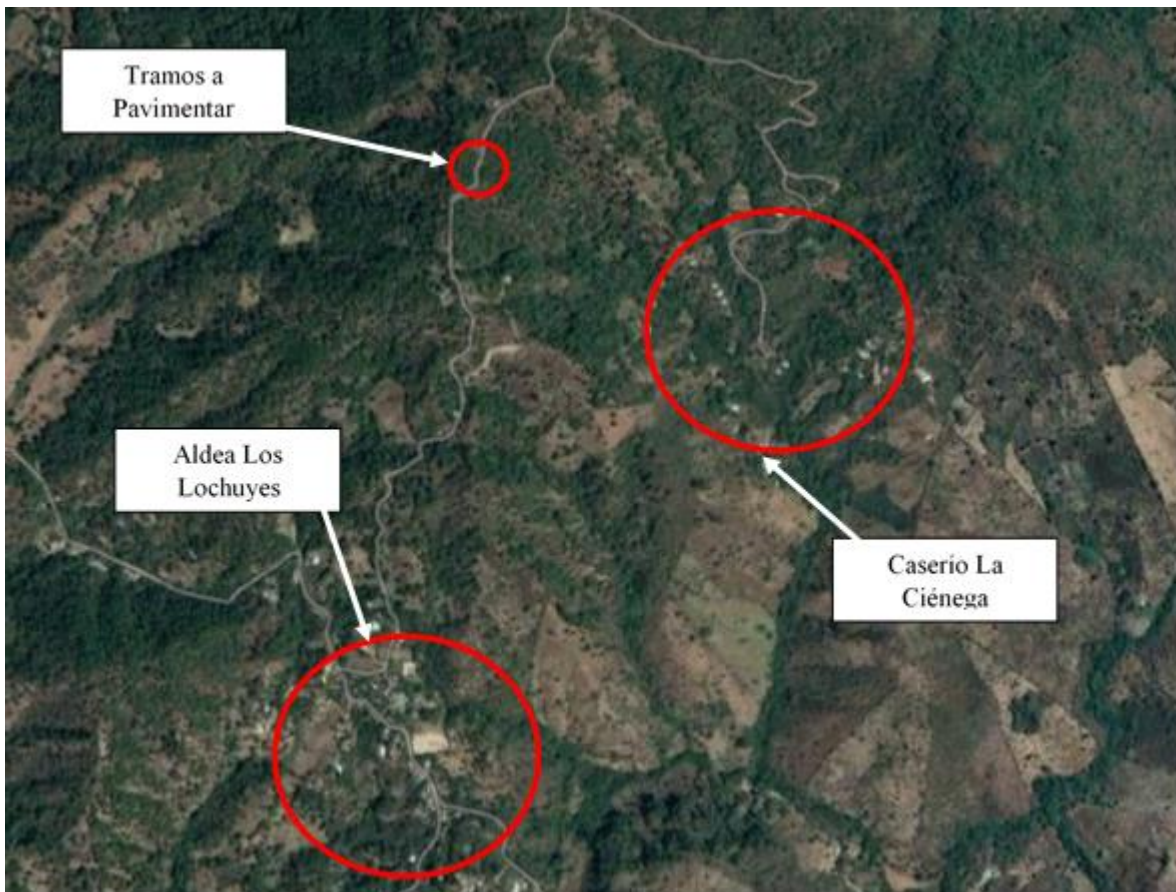

La topografía en la comunidad se caracteriza por tener un relieve con pendientes muy pronunciadas, La comunidad cuenta con algunos ríos y quebradas que solo cuentan con caudal durante la época húmeda.

Caracterización Socioeconómica

La población de Aldea Los Lochuyes cuenta en la actualidad con una población de 656 personas (proyección población 2021 DMP), el nivel de escolaridad en los jóvenes de 18 a 25 años corresponde a graduados en el ciclo diversificado, en las carreras de Bachillerato en Ciencias y Letras, Perito Contador. Las actividades económicas de los habitantes en la comunidad corresponden a negocios y empleo informal, agricultura en cultivos de granos de café y tomate; en la actualidad 3 de cada 5 familias tiene uno o varios integrantes de la misma viviendo en el extranjero, convirtiéndose el envío de remesas en la principal fuente de ingreso; esta fuente de ingresos permite aumentar el poder adquisitivo de las personas, quienes de forma indirecta promueven el crecimiento económico en la comunidad. Este crecimiento económico se manifiesta en la comunidad a través de la circulación de dinero que se genera en la misma, permitiendo que en la comunidad existe mayor demanda de servicios, mayor circulación vehicular y mayor desplazamiento de personas que en muchos casos se ve mermado por la deficiente calidad de la red vial en la comunidad.

La población que se ve afectada de forma directa corresponde a 656 personas, con una tasa de crecimiento del 0.76%, para el 2041 se espera que sea de 763 personas.

Año	Población	Fuente
Población 2014	622	Centro de Salud
Población 2016	632	Centro de Salud
Tasa de Crecimiento Poblacional	0.76%	Tasa de Crecimiento Poblacional DMP
Población 2021	656	Proyección Población DMP
Población 2040	763	Proyección Población DMP

La comunidad converge hacia el área urbana, por ser la centralidad más cercana al caserío, provocando afluencia vehicular en vehículo liviano de forma frecuente.

Organizaciones Comunales

La organización comunitaria que gestiona ante organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en la comunidad de Aldea Los Lochuyes es el Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), quienes presentan ante la Municipalidad a través del Consejo Municipal de Desarrollo (COMUDE), las prioridades más sentidas de la comunidad, además de ser quienes interactúan con las problemáticas día con día.

Además, según entrevista realizada a la Directora de la Dirección Municipal de La Mujer explica que existe conformación de comité de mujeres, quienes realizan acciones de emprendimiento en huertos familiares; y, participan en comisiones comunitarias de prevención de la violencia y del delito COMUPRE.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación a través de los extensionistas rurales han conformado Los Centros de Aprendizaje para el Desarrollo Económico Rural CADER, algunos de los pobladores pertenecen a la Asociación de Productores Agropecuarios APSCHOL, y a la Asociación de Ganaderos.

Caracterización Económica

Las dependencias de ingresos de los comunitarios y el ingreso promedio por cada actividad económica se detallan en la siguiente tabla:

Dependencia del Ingreso	Ingreso promedio Mensual
Agricultores	Q. 950.00
Albañilería	Q. 3,500.00
Propietarios de negocios informales	Q. 1,000.00
Empleados informales	Q. 1,000.00
Remesas para gastos familiares	Q. 1,200.00
Ganadores	Q. 3,000.00
Remesas para inversión (inmuebles)	Q. 4,250.00

Se destaca el hecho de que algunos pobladores pueden diversificar la dependencia del ingreso, permitiendo aumentar el ingreso promedio por familia. Los datos anteriormente descritos fueron obtenidos por dependencias estatales (MAGA y MSPAS) y entrevistas realizadas a vecinos de la comunidad.

Servicios existentes

Estos servicios corresponden a las competencias de gobierno para mejorar la calidad de vida de la población, actualmente cuentan con los siguientes servicios: educación preprimaria y educación primaria, el ciclo de nivel medio lo realizan dirigiéndose hacia los establecimientos públicos y privados ubicados en el área urbana del Municipio los cuales cuentan con la infraestructura adecuada para el servicio de educación para los niños y niñas, así como también a los jóvenes y señoritas que estudian el nivel básico. La comunidad cuenta con servicio de agua entubada, la cual abastece la totalidad de familias de la comunidad, el servicio de energía eléctrica cubre la totalidad de las viviendas, cuentan con fosas sépticas para el tratamiento de aguas grises. Cuentan además con el Instituto Nacional de Educación Básica INEB Telesecundaria. Otros de los servicios con los que se cuenta en la comunidad que son propiedad de personas individuales se pueden mencionar, tiendas que abastecen de productos de primera necesidad a la población y motores de nixtamal.
















Justificación de la Solución de la Problemática

Situación sin Proyecto

Las condiciones de las calles y carreteras del municipio para el traslado de personas, mercaderías y productos hacia centralidades para obtener la prestación de un servicio público como: salud, educación, registro de personas, juzgado de paz, policía nacional civil, asesoría en los ministerios como MIDES, MAGA, y obtención de servicios privados como: espacios comerciales para consumo de alimentos, vestimenta, calzado, aseo personal, artículos de primera necesidad procesados, artículos de educación, materiales de construcción entre otros, no son las adecuadas, existen retrasos y dificultades por la circulación y desplazamiento, limitando y retrasando el desarrollo económico y social del municipio, además los costos en reparación de vehículos aumentan el gasto familiar, los costos de fletes, los costos en pasaje para el transporte de buses y microbuses son elevados. La movilidad y circulación de personas y vehículos se ve reducida, absteniendo el gasto a realizar en comercios locales y particulares y por ende limitando el crecimiento económico que se ve afecto en las condiciones socioeconómicas de las familias.

Situación con Proyecto:

Mejorar la infraestructura vial del municipio de Santa Cruz El Chol, permitirá el rápido desplazamiento de vehículos con mercadería manufacturada, materia prima, fácil acceso a servicios de salud, educación, rápido desplazamiento para emergencias, aumentar la competitividad económica, la reducción en gastos de reparación de vehículos, reducción de gasto en combustible, disminución de gases de dióxido de carbono por vehículo, promover la infraestructura para el desarrollo en comunidades urbanas y rurales e iniciar a crear canales de rápida comercialización y exportación (fuera del municipio) de materias primas, productos terminados y servicios prestados, favoreciendo con ello las oportunidades de crecimiento socioeconómico, la cobertura de servicios de salud, rápida atención ante emergencias, aumentar la circulación económica.

Carreteras en buen estado		
Indicador	Con Proyecto	Sin Proyecto
Fortalece a la industria nacional en sus procesos de producción, distribución y comercialización, haciéndola más productiva y competitiva.		
Crecimiento y desarrollo de un país		
Acceso rápido a mercados		
Abastecimiento rápido de materias primas y productos terminados		
Competitividad Empresarial y emprendedora		
Distribución de la Riqueza equitativa		
 Aumenta  Se Mantiene  Disminuye		

Análisis de Alternativas

Identificación de Alternativas

Se plantean tres alternativas para la solución de la problemática:

1. Inversión en Infraestructura vial duradera por parte de autoridades estatales:

1.1. Mejoramiento Camino Rural

Consiste en el mejoramiento de la superficie de rodadura que permita disparar eficientemente las solicitudes del tránsito, bien sea peatonal o vehicular, facilitando la movilidad de personas para la adquisición de servicios y coadyuvando con el desarrollo económico de los pequeños negocios que existen en el lugar.

Factibilidad del Proyecto:

Etapas del proyecto:



Cálculo de Inversión y (vida útil 20 años)

Etapas del Proyecto		
		TOTAL
Pre-Inversión		
	Estudio Técnico	Q20,000.00
	Estudios Ambientales	Q8,500.00
	Estudio Socio-Legal	Q8,000.00
	Estudio de Pre-Factibilidad	Q12,000.00
<i>Subtotal</i>		Q48,500.00
Etapa de Ejecución		
	Licitación Pública	Q500,696.00
<i>Subtotal</i>		Q500,696.00
Etapa de Supervisión		
	Mano de Obra Calificada	Q25,000.00
<i>Subtotal</i>		Q25,000.00
Etapa de Operación y Mantenimiento		
	Sostenibilidad del Proyecto 20 años	Q6,500.00
<i>Subtotal</i>		Q6,500.00
Total		Q580,696.00

Términos de Contratación:

Las entidades estatales para la contratación de servicios, adquisición de bienes y/o cualquier contratación que se necesite por parte de un tercero, estará regulado por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (Decreto 57-92) estableciendo para ello las modalidades de: compra de baja cuantía, compra directa, cotización y licitación pública.

Viabilidad del Proyecto:

Alcance del Proyecto:

Infraestructura vial en buen estado en el municipio, para facilitar la movilidad de personas en la comunidad propiciando el desarrollo económico de las mismas.

Factores Externos:

Incumplimiento de operación y mantenimiento por parte de entidades Estatales.

Viabilidad Técnica del proyecto

Contratación de personal técnico para la propuesta de pre-inversión y supervisión de la obra. Contratación de un tercero con las especialidades técnicas constructivas y precalificados otorgada por entidades estatales, considerando además la experiencia, capacidad técnica y humana para la ejecución de obras.

Viabilidad Política del Proyecto

El proyecto se orienta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, La Política General de Gobierno y los Productos Municipales del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial.

ODS	PND	PGG	Vinculación PDM/OT Productos Municipales
Industria, Innovación e Infraestructura	Reducción de la pobreza y protección social	Economía, competitividad y prosperidad	Mejoramiento y construcción de carreteras municipales

Análisis Costo/Eficiencia:

Resultados	
Valor actual neto	Q559,395.79
Costo anual equivalente	(Q74,891.23)
C/E	Q37.57

2. Inversión en mantenimiento Periódico por parte de autoridades estatales:

2.1. Mantenimiento de Camino Rural de Forma Periódica

Consiste en realizar trabajos de mantenimiento a través de la contratación de mano de obra no calificada (peón), y subcontratación de maquinaria para realizar trabajos de: escarificación, conformación y compactación de la superficie de rodadura. La limpieza de cunetas y drenajes será realizada por la mano de obra no calificada.

Factibilidad del Proyecto:

Etapas del proyecto:



Cálculo de Inversión y Fuente de Financiamiento (vida útil 20 años)

Etapas del Proyecto		
		TOTAL
Pre-Inversión		
	Estudio Técnico	Q20,000.00
	Estudios Ambientales	Q8,500.00
	Estudio Socio-Legal	Q8,000.00
	Estudio de Pre-Factibilidad	Q12,000.00
Subtotal		Q48,500.00
Etapa de Ejecución		
	Cotización Pública Anual	Q40,000.00
Subtotal		Q40,000.00
Etapa de Supervisión		
	Mano de Obra Calificada	Q25,000.00
Subtotal		Q25,000.00
Etapa de Operación y Mantenimiento		
	Sostenibilidad del Proyecto 20 años	Q40,000.00
Subtotal		Q40,000.00
Total		Q913,500.00

Términos de Contratación:

Las entidades estatales para la contratación de servicios, adquisición de bienes y/o cualquier contratación que se necesite por parte de un tercero, estará regulado por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (Decreto 57-92) estableciendo para ello las modalidades de: compra de baja cuantía, compra directa, cotización y licitación pública.

Viabilidad del Proyecto:

Alcance del Proyecto:

Infraestructura vial en buen estado, para facilitar la movilidad de personas en la comunidad propiciando el desarrollo económico de las mismas.

Factores Externos:

Voluntad política de los cambios de Gobierno.

Orientación del presupuesto hacia otros programas.

Incumplimiento de operación y mantenimiento por parte de entidades Estatales.

Viabilidad Técnica del proyecto

Contratación de personal técnico para la propuesta de pre-inversión y supervisión de la obra. Contratación de un tercero con las especialidades técnicas constructivas y precalificados otorgada por entidades estatales, considerando además la experiencia, capacidad técnica y humana para el mantenimiento de la calle de forma anual.

Viabilidad Política del Proyecto

El proyecto se orienta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, La Política General de Gobierno y los Productos Municipales del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial.

PND	PGG	Vinculación PDM/OT Productos Municipales
Reducción de la pobreza y protección social	Economía, competitividad y prosperidad	Mejoramiento y construcción de carreteras municipales

Análisis Costo/Eficiencia:

Resultados	
Valor actual neto	Q401,229.46
Costo anual equivalente	(Q53,716.11)
C/E	Q26.95

3. Inversión en reposición de la superficie de rodadura (balasto) por parte de autoridades estatales:

3.1. Reposición camino rural con capa de balasto.

Consiste en realizar trabajos de reposición de materiales en la carpeta de rodadura de las carreteras, para lo cual se necesita de un banco de materiales, acarreo y compactación.

Factibilidad del Proyecto:

Etapas del proyecto:



Cálculo de Inversión y Fuente de Financiamiento (vida útil 20 años)

Etapas del Proyecto		TOTAL
Pre-Inversión		
Estudio Técnico		Q20,000.00
Estudios Ambientales		Q8,500.00
Estudio Socio-Legal		Q8,000.00
Estudio de Pre-Factibilidad		Q12,000.00
Subtotal		Q48,500.00
Etapa de Ejecución		
Cotización Pública Anual		Q70,000.00
Subtotal		Q70,000.00
Etapa de Supervisión		
Mano de Obra Calificada		Q25,000.00
Subtotal		Q25,000.00
Etapa de Operación y Mantenimiento		
Sostenibilidad del Proyecto 20 años		Q70,000.00
Subtotal		Q1,400,000.00
Total		Q1,543,500.00

Términos de Contratación:

Las entidades estatales para la contratación de servicios, adquisición de bienes y/o cualquier contratación que se necesite por parte de un tercero, estará regulado por la Ley de Compras y Contrataciones del Estado (Decreto 57-92) estableciendo para ello las modalidades de: compra de baja cuantía, compra directa, cotización y licitación pública.

Viabilidad del Proyecto:

Alcance del Proyecto:

Infraestructura vial en buen estado en la comunidad de Aldea Los Jobos, para facilitar la movilidad de personas en la comunidad propiciando el desarrollo económico de las mismas.

Factores Externos:

Voluntad política de los cambios de Gobierno.

Orientación del presupuesto hacia otros programas.

Incumplimiento de operación y mantenimiento por parte de entidades Estatales.

Viabilidad Técnica del proyecto

Contratación de personal técnico para la propuesta de pre-inversión y supervisión de la obra. Contratación de un tercero con las especialidades técnicas constructivas y precalificados otorgada por entidades estatales, considerando además la experiencia, capacidad técnica y humana para el mantenimiento de la calle de forma anual.

Carreteras arriba del 25% de pendiente.

Viabilidad Política del Proyecto

El proyecto se orienta dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Prioridades Nacionales de Desarrollo, La Política General de Gobierno y los Productos Municipales del Plan de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial.

ODS	PND	PGG	Vinculación PDM/OT Productos Municipales
Industria, Innovación e Infraestructura	Reducción de la pobreza y protección social	Economía, competitividad y prosperidad	Mejoramiento y construcción de carreteras municipales

Análisis Costo/Eficiencia:

Resultados	
Valor actual neto	Q702,151.56
Costo anual equivalente	(Q94,003.19)
C/E	Q47.15

Alternativa Seleccionada

Análisis de Alternativa:

Calificación de Alternativas (Infraestructura Vial)
Problemática: 85% de la infraestructura vial en mal Estado en el Municipio
Solución: Mejorar el 85% de la infraestructura vial en el Municipio



1
5

Calificación
Bajo
Alto

Alternativas	Mejoramiento Camino Rural	Reposición Camino Rural	Mantenimiento Camino Rural de forma Periódica
Criterios			
Recursos disponibles actualmente	5	5	5
Facilidad en Mantenimiento y Operación	5	4	4
Costo Total Actual de la Obra	4	4	5
Costo/Eficiencia	3	2	5
Resiliencia ante cambio climático (Lluvias)	5	4	3
Sostenibilidad	5	3	2
Viabilidad Social y Económica	5	4	4
Infraestructura orientada al desarrollo	5	5	5
Total	37	31	33

La alternativa seleccionada para la solución de la problemática es: **Mejoramiento Camino Rural**, debido a que la inversión que se requiere en la sostenibilidad del proyecto es menor a las otras alternativas, además de la facilidad que se realiza en el Mantenimiento y Operación por lo tanto representa la mejor alternativa.

Formulación del Proyecto

Descripción del Proyecto

El proyecto comprende la construcción de 848 metros cuadrados de pavimento, comprendiendo el colocado de base + compactado y la fundición de pavimento de concreto con un espesor de quince centímetros y fundición de cuneta, los renglones de trabajo se detallan a continuación:

No	DESCRIPCIÓN
1	TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO
2	NIVELACION DE SUB- RASANTE + COMPACTADO
3	COLOCADO DE BASE + COMPACTADO t = 0.10 m
4	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m
5	FUNDICION DE BORDILLO
6	LIMPIEZA FINAL

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

- Mejorar el 85% de la infraestructura vial en el municipio.

Objetivos Específicos

- 1- Impulsar el desarrollo económico y social de los pobladores de la comunidad de: Los Lochuyes.
- 2- Facilitar la circulación vehicular y peatonal.
- 3- Promover y aumentar el comercio local.
- 4- Mejorar los espacios existentes para prevenir enfermedades respiratorias provocadas por partículas de polvo en niños y personas adultas.

Metas o Resultados

- 1- Aumentar en 25 puntos porcentuales el ingreso mensual de las personas con negocios informales en la comunidad durante los primeros cinco años.
- 2- Aumento en 0.5 puntos porcentuales de carreteras pavimentadas en el municipio.
- 3- Disminución de gasto personal en Q. 200.00 quetzales mensuales en reparación de vehículos.

Estudio de Mercado

Precio

El servicio que se ofertará a la población para mejorar la infraestructura vial y con ello facilitar la movilidad y disminuir tiempos entre un centro poblado hacia una centralidad será en metros cuadrados. El costo del metro cuadrado de pavimento es de Q. 590.00

Demanda

*Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia*



DELEGACION DE BAJA VERAPAZ

ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA

La estimación de la demanda actual y futura para proyectos de vías de transporte o transporte en sí; se ha fundamentado, en el tiempo que la población emplea para trasladarse de un lugar a otro (de preferencia extremos de la vía a construir). Si bien, deberían emplearse datos económicos (incremento en la producción o extracción de la misma, incrementos en beneficios económicos, etc.) o aforos vehiculares; se emplea el tiempo por la carencia de los datos históricos anteriormente mencionados. Esto no significa que el formulador no pueda recolectarlos y emplearlos para la realización de su estudio de mercado o que toda esa información complemente a la presente.

Código SNIP:	260461		
Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA LOS LOCHUYES HACIA CASERIO LA CIENEGA EL CHOL BAJA VERAPAZ		
Distancia	0.3	kilómetros	
Tiempo que se emplea para recorrer a pie dicha distancia (ida y vuelta)	0.2	horas	
Cantidad aproximada de viajes que una persona realizar en una semana	14	viajes / semana	

Fórmulas empleadas:	Tiempo empleado * Viajes semanales * Población * Equivalencias
---------------------	--

Equivalencias empleadas				
1	año	equivale a	54	semanas
1	mes	equivale a	4	semanas

Demanda actual y futura

Id año	Año	Población	Demanda		
			horas/año	horas/mes	horas/semana
0	2021	656	99,187	7,347	1,837
1	2022	661	99,951	7,404	1,851
2	2023	666	100,721	7,461	1,865
3	2024	671	101,496	7,518	1,880
4	2025	676	102,278	7,576	1,894
5	2026	682	103,065	7,634	1,909
6	2027	687	103,859	7,693	1,923
7	2028	692	104,658	7,752	1,938
8	2029	698	105,464	7,812	1,953
9	2030	703	106,276	7,872	1,968
10	2031	708	107,095	7,933	1,983
11	2032	714	107,919	7,994	1,999
12	2033	719	108,750	8,056	2,014
13	2034	725	109,588	8,118	2,029
14	2035	730	110,432	8,180	2,045
15	2036	736	111,282	8,243	2,061
16	2037	742	112,139	8,307	2,077
17	2038	747	113,002	8,371	2,093
18	2039	753	113,872	8,435	2,109
19	2040	759	114,749	8,500	2,125
20	2041	765	115,633	8,565	2,141
	Promedios	709.06	107,210.32	7,941.50	1,985.38

*Tabla de demanda actual y futura del proyecto. Los datos mostrados en rojo corresponde a la demanda actual y futura.
Fuente:*

Para complementar la información mostrada en la tabla anterior se realizó un aforo vehicular a través de la observación de vehículos que circulan en el área, especialmente en los puntos críticos del trayecto, (lugares que presentan dificultad en la circulación vehicular por deterioro de la carretera).

Demanda Vehicular:

Aforo Vehicular:

La circulación de vehículos en la comunidad que utilizan el camino corresponde a los centros poblados de Aldea Los Lochuyes, Aldea Los Jobs, Aldea Lo de Reyes, la obtención del aforo vehicular por día incluye vehículos de dos ruedas, transporte liviano y

transporte pesado, los días aforados fueron: **Lunes**, por ser inicio de semana, **Jueves**, por ser día de plaza en el área urbana del municipio, **Domingo**, por ser también día de plaza y eventos deportivos y culturales en el municipio.

Descripción	Vehículos por día	Vehículos por mes	Vehículos por año
Año 2021	345	10,350	124,200
Año 2041	623	18,690	224,280
Consideración del 3% de crecimiento vehicular anual			

Oferta:

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia



DELEGACION DE BAJA VERAPAZ

ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL Y FUTURA

Para los tres procesos, la oferta consistirá en un ahorro de tiempo que experimentarán los usuarios al hacer uso de la ruta, sea esta nueva o no. Por lo que en esta herramienta se muestra el tiempo empleado (al ya tener la vía construida, mejorada o ampliada) y también se aprecia la diferencia entre tiempos. Se asume que las vías de transporte recibirán el mantenimiento adecuado y que siempre estarán en condiciones ideales que permitan la libre circulación.

Código SNIP:

260461

Nombre del proyecto:

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA LOS LOCHUYES HACIA CASERIO LA CIENEGA EL CHOL BAJA VERAPAZ

Distancia	0.3	kilómetros
Tiempo que se emplea para recorrer en vehículo dicha distancia (ida y vuelta)	0.066	horas
Cantidad aproximada de viajes que una persona realizar en una semana	14	viajes / semana

Fórmulas empleadas:

Tiempo empleado * Viajes semanales * Población * Equivalencia

Equivalencias empleadas				
1	año	equivale a	54	semanas
1	mes	equivale a	4	semanas


Oferta del proyecto								
Id año	Año	Población	Demanda					
			horas/año	Diferencia	horas/mes	Diferencia	horas/semana	Diferencia
				horas/año		horas/mes		horas/semana
0	2021	656	32,732	66,455	2,425	4,923	606	1,231
1	2022	661	32,984	66,967	2,443	4,961	611	1,240
2	2023	666	33,238	67,483	2,462	4,999	616	1,250
3	2024	671	33,494	68,002	2,481	5,037	620	1,259
4	2025	676	33,752	68,526	2,500	5,076	625	1,269
5	2026	682	34,012	69,054	2,519	5,115	630	1,279
6	2027	687	34,273	69,585	2,539	5,154	635	1,289
7	2028	692	34,537	70,121	2,558	5,194	640	1,299
8	2029	698	34,803	70,661	2,578	5,234	645	1,309
9	2030	703	35,071	71,205	2,598	5,274	649	1,319
10	2031	708	35,341	71,753	2,618	5,315	654	1,329
11	2032	714	35,613	72,306	2,638	5,356	660	1,339
12	2033	719	35,888	72,863	2,658	5,397	665	1,349
13	2034	725	36,164	73,424	2,679	5,439	670	1,360
14	2035	730	36,442	73,989	2,699	5,481	675	1,370
15	2036	736	36,723	74,559	2,720	5,523	680	1,381
16	2037	742	37,006	75,133	2,741	5,565	685	1,391
17	2038	747	37,291	75,711	2,762	5,608	691	1,402
18	2039	753	37,578	76,294	2,784	5,651	696	1,413
19	2040	759	37,867	76,882	2,805	5,695	701	1,424
20	2041	765	38,159	77,474	2,827	5,739	707	1,435
	Promedios	709.06	35,379.40	71,830.91	2,620.70	5,320.81	655.17	1,330.20

Tabla de oferta actual y futura del proyecto. Los datos mostrados en rojo corresponde a la oferta actual y futura. Fuente:

Oferta ante Aforo Vehicular


Considerando un crecimiento del 3% anual en aforo vehicular no industrial, el mejoramiento de camino rural deberá contar con una base de 10 cm de grosor como mínimo y una carpeta de rodadura de 15 centímetros de grosor. Las especificaciones del pavimento permitirán la circulación de 2,000 a 5,000 vehículos diarios de forma frecuente.

Balance Demanda-Oferta

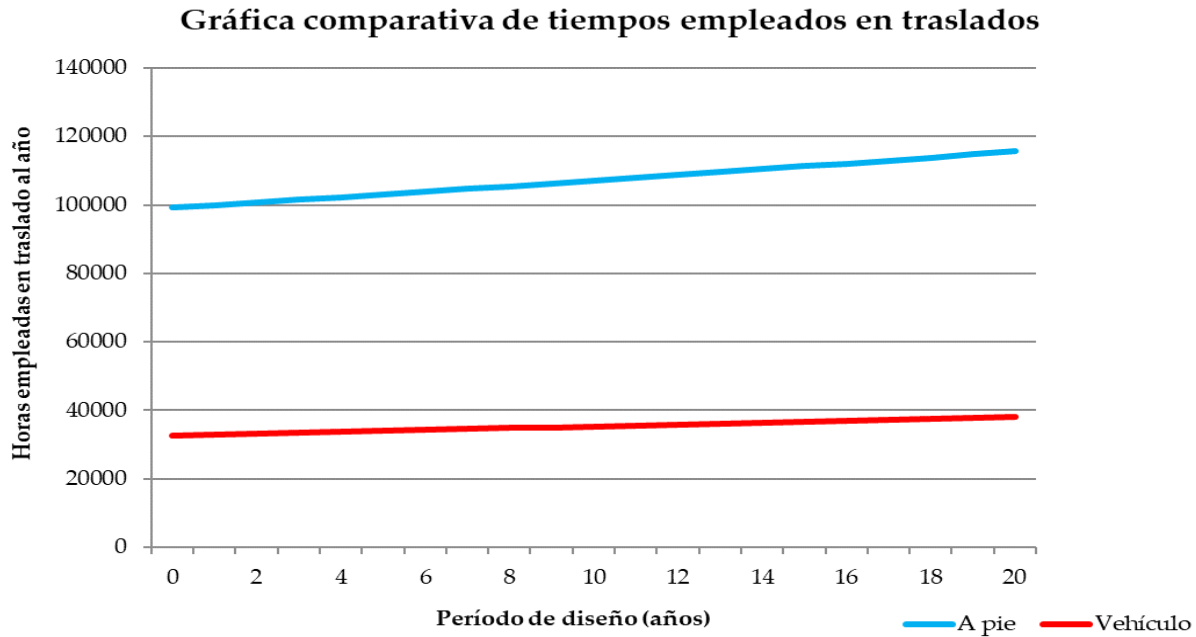

La gráfica indica que el tiempo empleado en el traslado de vehículos y transeúntes disminuye con el mejoramiento del camino rural.

Balance oferta y demanda ante aforo vehicular

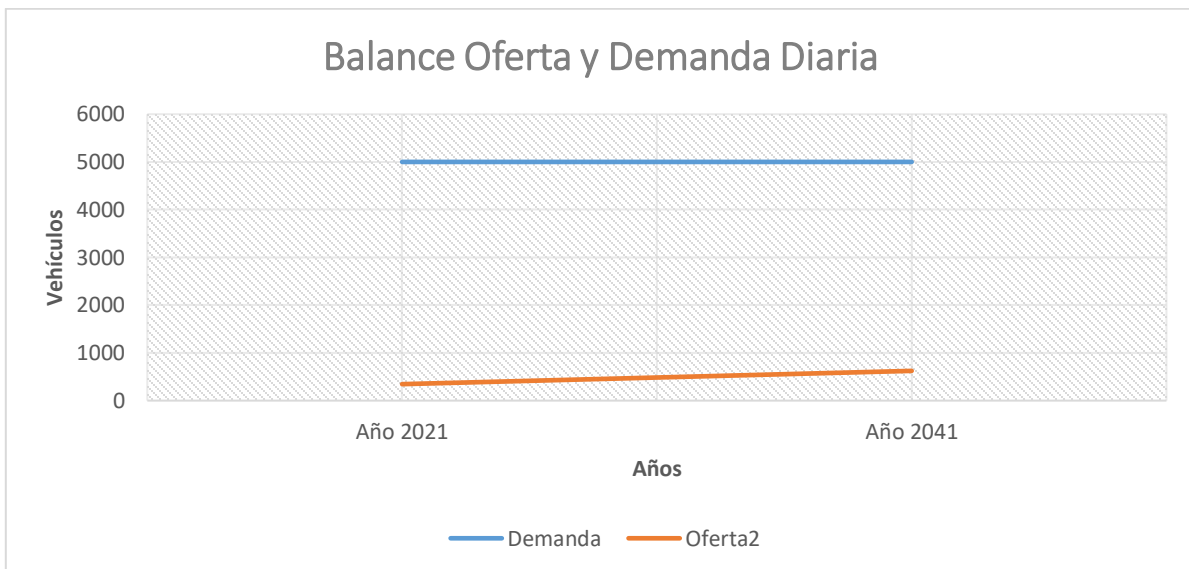


Ingresos por servicios prestados

El proyecto no genera ningún ingreso para las entidades estatales, por lo tanto, el gasto a ejecutar de forma anual será absorbido por la entidad estatal.

Estudio Técnico

Localización

El proyecto se ejecutará a 3 kilómetro del área urbana del municipio, y corresponde al mejoramiento de camino rural.

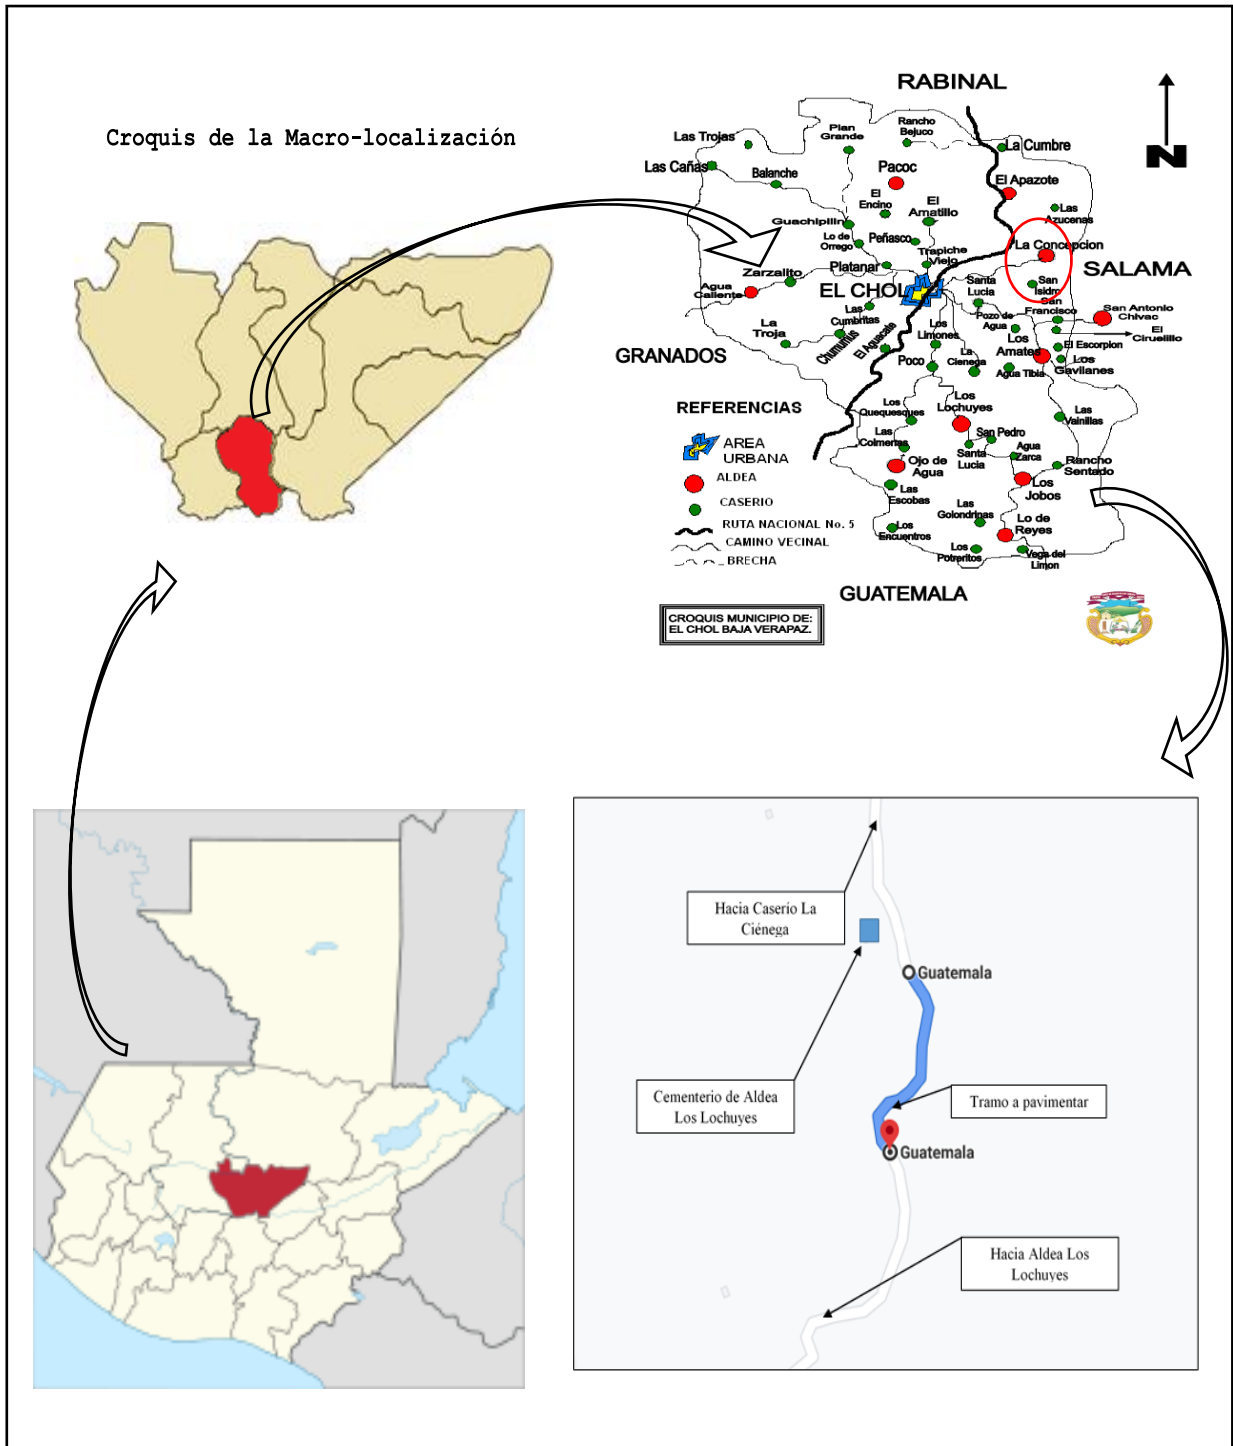

Micro-Localización



Tamaño

Dimensiones del proyecto:

criterio	Unidad de Medida	Cantidad
Fundición pavimento de concreto	M2	877.50
Longitud del tramo	ML	200
Ancho promedio del tramo	ML	4.5
Fundición de Bordillo	ML	194
Capacidad promedio de circulación diaria de vehículos	UNIDAD	5,000
Beneficiarios	Persona	656

Ingeniería y Tecnología

Accesos

Tomar en cuenta cruces de calle a establecimientos de comercio, salud, educación u otros existentes y/o a futuro, para diseñar pasos de cebra, rampas, señalizaciones, altura de bordillos y todos los componentes que hagan optimo el uso y desplazamiento en general.

Tecnología

Verificar horas pico de movilidad de personas o vehículos, y que el uso de equipo sea de uso optimizado, para que una tarea no se prolongue más del tiempo establecido. Motores en buen estado, además utilizar silenciadores. Minimizar el uso de maquinaria si no es necesario y que puedan ser realizadas por humanos debido a que en nuestro medio no contamos con el sistema Reducción Catalítica Selectiva SCR, con esto se estará reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

Cronograma de Ejecución Física

CRONOGRAMA DE EJECUCION

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS LOCHUYES, SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ.

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	TIEMPO EN MESES			
						1	2	3	4
1	TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	200.70	4.20	Q842.94	■			
2	CORTE DE CAJUELA Y NIVELACION DE SUB- RASANTE + COMPACTADO	M3	87.75	395.00	Q34,661.25	■	■		
3	COLOCADO DE BASE + COMPACTADO t = 0.10 m	M2	877.50	37.90	Q33,257.25		■		
4	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m	M2	877.50	427.60	Q375,219.00		■	■	■
5	CORTE DE JUNTA LONGITUDINAL + SELLO ELASTOMERICO	ML	200.00	38.45	Q7,690.00			■	■
6	CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL	ML	437.500	25.90	Q11,331.25			■	■
7	FUNDICION DE BORDILLO	ML	194.00	180.00	Q34,920.00				■
8	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA DE (De 1.00 x 4.00 Mts)	UD	1.00	2,515.41	Q2,515.41				■
9	LIMPIEZA FINAL	ML	200.70	1.29	Q258.90				■
COSTO TOTAL					Q500,696.00				

Cronograma de Ejecución Financiera

CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS LOCHUYES, SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ.

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL	TIEMPO EN MESES				
						1	2	3	4	
1	TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	200.70	4.20	Q842.94	■				
2	CORTE DE CAJUELA Y NIVELACION DE SUB- RASANTE + COMPACTADO	M3	87.75	395.00	Q34,661.25	■	■			
3	COLOCADO DE BASE + COMPACTADO t = 0.10 m	M2	877.50	37.90	Q33,257.25		■			
4	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m	M2	877.50	427.60	Q375,219.00		■	■	■	
5	CORTE DE JUNTA LONGITUDINAL + SELLO ELASTOMERICO	ML	200.00	38.45	Q7,690.00			■	■	
6	CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL	ML	437.500	25.90	Q11,331.25			■	■	
7	FUNDICION DE BORDILLO	ML	194.00	180.00	Q34,920.00				■	
8	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA DE (De 1.00 x 4.00 Mts)	UD	1.00	2,515.41	Q2,515.41				■	
9	LIMPIEZA FINAL	ML	200.70	1.29	Q258.90				■	
COSTO TOTAL					Q500,696.00	Q68,761.44	Q 187,609.50	Q 206,630.75	Q37,694.31	Q 500,696.00
						13.73%	37.47%	41.27%	7.53%	100.00%

Presupuesto

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS LOCHUYES , SANTA CRUZ EL CHOL BAJA VERAPAZ.

No	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
1	TRAZO + REPLANTEO TOPOGRAFICO	ML	200.70	4.20	Q842.94
2	CORTE DE CAJUELA Y NIVELACION DE SUB- RASANTE + COMPACTADO	M3	87.75	395.00	Q34,661.25
3	COLOCADO DE BASE + COMPACTADO t = 0.10 m	M2	877.50	37.90	Q33,257.25
4	FUNDICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO t = 0.15m	M2	877.50	427.60	Q375,219.00
5	CORTE DE JUNTA LONGITUDINAL + SELLO ELASTOMERICO	ML	200.00	38.45	Q7,690.00
6	CORTE DE JUNTA TRANSVERSAL	ML	437.50	25.90	Q11,331.25
7	FUNDICION DE BORDILLO	ML	194.00	180.00	Q34,920.00
8	RAMPA DE INGRESO Y SALIDA DE (De 1.00 x 4.00 Mts)	UD	1.00	2,515.41	Q2,515.41
9	LIMPIEZA FINAL	ML	200.70	1.29	Q258.90
COSTO TOTAL					Q500,696.00

Financiamiento

Las fuentes de financiamiento para la ejecución del proyecto se describen en el siguiente cuadro:

Fuente de Financiamiento	
CODEDE IVA-PAZ	31-0101-0004
INGRESOS ORDINARIOS APORTE CONSTITUCIONAL	22-0101-0001
APORTE COMUNITARIO	31-3101-0002

Actividades de cierre de Proyecto

Para evaluar la ejecución del proyecto en base a la planificación, la unidad ejecutora dispondrá de un supervisor de obras, quien evaluará la etapa de ejecución y considerará cambios que deban realizarse o acciones que deban corregirse previo a la finalización de la obra.

Los costos incurridos durante la ejecución del proyecto serán absorbidos por la municipalidad, pagando mensualmente los servicios de un ingeniero civil. El costo estimado de supervisión es de: Q. 25,000.00.

Estudio Administrativo

Operación y Mantenimiento

La operación del tramo pavimentado se realizará de forma institucional, debido a que el 100% del tramo mejorado corresponde a carreteras municipales.

El mantenimiento se clasificará en dos fases. la primera fase consiste en el mantenimiento que se deberá de realizar de forma anual; en la segundo fase se realizarán dos trabajos, el primero al haber transcurrido diez años, y el segundo se realizará cinco años más tarde.

Fase I del mantenimiento:

Renglón	Costo Unitario	Cantidad	Total
Limpieza de Carreteras			
Jornales	Q. 75.00	12	Q. 900.00
Insumos de Limpieza	Q.1.00	100	Q. 100.00
Total			Q. 1,000.00

Fase II del mantenimiento:

Renglón	Costo Unitario	Cantidad	Total
Bacheo	Q. 26,500.00	2	Q. 53,000.00
Supervisión	Q. 11,000.00	2	Q. 22,000.00
Sellado de Grietas	Q. 17,500.00	2	Q. 35,000.00
Total			Q. 110,000.00

Costo promedio anual de operación: Q. 6,500.00

Pavimentos Rígidos

Son aquellos formados por una losa de concreto sobre una base, o directamente sobre la sub-rasante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma minimizada, es auto-resistente, y la cantidad de concreto debe ser controlada. El

mantenimiento que se realiza a este tipo de estructuras se basa en el sellado de juntas, fisuras, grietas y en las reparaciones necesarias de la losa de concreto.

Mantenimiento Preventivo

Consiste en actividades y obras de mantenimiento destinadas a prevenir fallas en la vía y que han sido identificadas como defectuosas o con alto riesgo de que ocurran y que deben ser tratadas antes de que éstas sucedan.

Mantenimiento Periódico

Abarca las obras de conservación vial que se realizan en períodos programados, generalmente más de un año de intervalo, para elevar la vía a un nivel de servicio bueno o muy bueno. Está considerada, entre otros, la colocación de sobre capas en pavimentos deteriorados existentes y el mejoramiento de las capas de la estructura.

Mantenimiento Rutinario

Comprende la realización de aquellas actividades requeridas para conservar una vía en buen estado, las cuales se repiten una o más veces al año. También, incluye aquellas labores de reparación vial destinadas a recuperar ciertos elementos con daños menores, tales como los barandales de puentes, obras de drenaje menor, señalización vertical y horizontal, muros de retención y actividades afines.

Mantenimiento Correctivo

Es aquel que corrige los defectos observados en los equipamientos o instalaciones, es la forma básica de mantenimiento y consiste en localizar averías o defectos y corregirlos o repararlos, este mantenimiento que se realiza luego que ocurra una falla que por su naturaleza no pueden planificarse en el tiempo, presenta costos por reparación no presupuestado.

Limpieza de elementos de seguridad vertical existente

La limpieza de elementos de seguridad vertical existente consistirá en darle mantenimiento a la señalización vertical existente y dispositivos de seguridad vial, con el fin de que sean visibles en cualquier época del año y brinden a los usuarios adecuada

visibilidad de las señales. Incluye limpieza de señales de tránsito dentro del derecho de vía y defensas metálicas con sus elementos refractivos.

En los procedimientos de ejecución inicialmente consiste en colocar dispositivos de seguridad transitoria y verificar que todo el personal disponga de la vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito. Será realizada luego de la ejecución de la limpieza del derecho de vía. La limpieza se efectuará manualmente o con una máquina para lavado a presión.

Sellado de juntas, fisuras y grietas de concreto hidráulico

Las juntas, cualquiera que sea su función principal, deben rellenarse y/o sellarse con materiales apropiados, deben realizarse preferentemente antes de la apertura del tránsito en la carretera, siguiendo las recomendaciones y/o instrucciones de los fabricantes del producto que se colocará. El sello de fisuras y grietas es una actividad de mantenimiento preventivo y debe realizarse antes que el agua penetre a la base del pavimento y cause daños a la estructura del mismo (subrasante, sub-base o base) o al pavimento en sí.

Ambas actividades no podrán ejecutarse:

En áreas donde el agua haya penetrado y causado daño a cualquier parte de la estructura del pavimento cuando el pavimento muestre daños en su estructura y sea necesaria su reconstrucción y/o sustitución.

Debe verificarse que el pavimento no muestre señales de humedad, las cuales causarían falta de adherencia del material y posterior desprendimiento del mismo.

Comprende el suministro de mano de obra, materiales, equipo y la ejecución de las operaciones necesarias para sellar las juntas, fisuras y grietas en el concreto hidráulico, que hayan sido identificadas por el supervisor. El equipo necesario para este procedimiento se describió de la siguiente manera:

Equipo Ranurador: para la elaboración y/o re perfilado de juntas, se dispondrá de un ranurador rotatorio autopropulsado, o de un ranurador de cuchilla vertical. La máquina ranuradora deberá ser capaz de seguir la huella de la grieta, ensanchando la parte superior de la misma a la sección requerida, sin descascarar o dañar el concreto.

Inyector de aire comprimido: deberá tener la capacidad para suministrar aire comprimido, limpio y seco (sin aceite ni humedad).

Material de respaldo: en las juntas, generalmente se instala un respaldo de esponja, por medio de una rueda de acero a la profundidad especificada, cuidando de no doblar o estirar este respaldo durante su instalación. La longitud del respaldo debe ser limitada a la que puede ser sellada el mismo día.

Aplicador del material de sello: se dispondrá de un aplicador para inyectar el material de sello dentro de la fisura, grieta o junta. El equipo de aplicación de material sellante en caliente, debe disponer de un dispositivo controlador de temperatura (deberá mantenerse la temperatura de aplicación dentro del rango de tolerancia recomendado por el fabricante para dicho material y no debe ser colocado cuando la temperatura ambiente a la sombra sea menor de 10 C.).

El vertido se debe realizar de forma que el material no se derrame sobre las superficies expuestas del concreto.

Material secante: en el caso del sellado de las fisuras y grietas, y antes de permitir el paso vehicular, se debe colocar el material secante sobre el elemento sellador, que cumplan las características descritas en el numeral 301.02 de este manual. Cualquier material sobrante que quede sobre la superficie del pavimento de concreto, debe ser retirado inmediatamente y se debe limpiar la superficie del pavimento.

En los procedimientos de ejecución inicialmente consiste en colocar dispositivos de seguridad transitorios y verificar que todo el personal disponga de la vestimenta obligatoria y en buen estado, y asegurar el control adecuado del tránsito.

Las juntas, fisuras y grietas que contengan restos de sellos antiguos o materias extrañas, deberán limpiarse completa y cuidadosamente en toda su profundidad. Para esto se podrá utilizar equipo ranurador, herramientas manuales u otros equipos adecuados que permitan remover el sello o relleno antiguo sin afectar al concreto. No deberán utilizarse equipos neumáticos de percusión u otras herramientas o elementos destinados a picar la junta, pues estos pueden soltar o desprender trozos de concreto.

Para las fisuras y grietas que no han sido tratadas previamente, se deberá formar una ranura o caja de reservorio con equipo ranurador, en todo el recorrido de la grieta, en una profundidad mínima de 20 milímetros y en un ancho, no menor de 4 milímetros ni mayor de 12 milímetros.

Se deberán seguir las recomendaciones del fabricante del sello (en cuanto a relación ancho a espesor) y este deberá quedar a una profundidad aproximada de 3 milímetros abajo de los bordes de la junta o grieta, para evitar que sea removido por el tráfico vehicular. La aplicación del sellador deberá realizarse con equipo adecuado.

El contratista después de la aplicación del material sellador, deberá dejar la superficie del concreto completamente limpia. Cuando existan defectos de calidad, construcción, acabado o en caso de que la obra ejecutada no presente un desempeño adecuado, el contratista deberá remover y reconstruir el tramo afectado.

Administración:

La administración del proyecto estará a cargo de la Municipalidad de Santa Cruz El Chol, los costos administrativos del proyecto serán amortizables en el gasto que las entidades estatales destinan a la red vial a la cual brindan mantenimiento.

Mantenimiento y vida útil

La vida útil del proyecto con los mantenimientos necesarios será de 20 años; el gasto que representará la infraestructura en esos 20 años es de un 30% desde su inauguración, el gasto anual representa el 1.5%.

Estudio Legal

Documentos Socio-legales:

Para la conformación del estudio de pre-inversión y respaldar la inversión en la Comunidad es necesaria la siguiente documentación:

Certificación de personería jurídica del COCODE representante del proyecto.

Nombramiento del presidente del COCODE.

Documento de Identificación del Presidente de COCODE.

Acta de Priorización del Proyecto por parte del Consejo Comunitario de Desarrollo.

Acta de Priorización y aprobación del proyecto por parte del Consejo Municipal de Desarrollo.

Solicitud del proyecto.

Certificación del punto de acta municipal que respalda los derechos de paso en la carretera, indicando que el proyecto se realiza en vía pública.

Documentación Legal durante su ejecución (contratación y ejecución):

Debido al costo del proyecto durante su ejecución se hace necesaria la subcontratación de empresas constructoras, y para el efecto debe de cumplirse con lo estipulado en el Decreto número 57-92; “Ley de Contrataciones del Estado” Título III Régimen de Licitación y Cotización Pública, Capítulo I Régimen de Licitación y sus artículos.

La ejecución de la obra deberá de considerar lo estipulado en las normas CoST Iniciativa de Transparencia en Infraestructura, así como las reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto.

Documentación Legal durante su operación y mantenimiento:

Aprobación por parte del Consejo Municipal del proyecto Conservación de Caminos rurales, la cual incluirá dentro de sus rubros el monto destinado al mantenimiento de los caminos pavimentados que conducen hacia los centros poblados del municipio.

Estudio Ambiental

En los aspectos ambientales se debe considerar la realización del instrumento EIA (Evaluación de Impacto Ambiental) categoría C con Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Seguridad Industrial y Vial, según listado taxativo 204-2019 del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, en su sector 10: INFRAESTRUCTURA, CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA; Subsector: Infraestructura; Numeral: 8: Actividad Económica: Construcción de Carreteras y líneas de Ferrocarril: Descripción: Reparación, Mantenimiento y Rehabilitación de Calles, Caminos, Puentes y Carreteras: Factor de Impacto: Longitud; Unidad de Medida: Kilómetros Lineales.

En la ejecución del proyecto, éste provocará cambios en el paisaje, así como contaminación por los residuos de construcción. El proyecto contempla en lo que respecta a los residuos de construcción medidas que consiste en el tratamiento y manejo de los mismos, esto de acuerdo a la Resolución Ambiental emitida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

Medidas de Mitigación Ambiental (ejecución)

Variables/Sistemas Ambientales Afectadas	Fuente del Impacto	Impacto Ambiental	Medidas de Mitigación
Suelo	Base y Sub-base, remoción de suelo	Alteración del Suelo	Reutilización adecuada del suelo
	Generación de residuos sólidos	Contaminación de suelo	Utilización de recipientes por tipo de residuos y traslado dos veces por semana de residuos sólidos a lugar autorizado por la Municipalidad
Calidad del Aire	Traslado de materiales de construcción	Generación de polvo	Humedecer materiales de traslado y construcción, humedecer áreas de generación de polvo
Social Antropogénicos	Seguridad laboral Seguridad peatonal Seguridad Vial	Accidentes laborales	Equipo de protección Señalización de área de trabajo. Señalización de vías alternas en calles y caminos.

Estudio Financiero

Presupuesto de Ejecución

Fuentes de Financiamiento	2021	Total
Gobierno Central	Q. 475,576.00	Q. 475,576.00
Comunidad	Q. 5,007.00	Q. 5,007.00
Aporte Municipal	Q. 20,113.00	Q. 20,113.00
Total	Q. 500,696.00	Q. 500,696.00

La ejecución del proyecto será ejecutado en el ejercicio fiscal 2021.

Presupuesto de Pre-Inversión

Etapas del Proyecto		
		TOTAL
Pre-Inversión		
	Estudio Técnico	Q20,000.00
	Estudios Ambientales	Q8,500.00
	Estudio Socio-Legal	Q8,000.00
	Estudio de Pre-Factibilidad	Q12,000.00
<i>Subtotal</i>		Q48,500.00

Presupuesto de Operación y Mantenimiento

Etapa de Operación y Mantenimiento		
	Sostenibilidad del Proyecto 20 años (Costo Anual)	Q6,500.00
<i>Subtotal</i>		Q6,500.00

Valor Actual del Costo

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia



DELEGACIÓN DE BAJA VERAPAZ

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

Código SNIP:	260461
Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA LOS LOCHUYES HACIA CASERIO LA CIENEGA EL CHOL BAJA VERAPAZ

Costo del valor actual de los costos					
Id	Año	Inversión inicial	Costos de operación y mantenimiento	Factor de actualización ^a	Costos actualizados
0	2021	Q500,696.00		12%	Q500,696.00
1	2022		Q6,699.12	0.892857143	Q5,981.36
2	2023		Q6,900.09	0.797193878	Q5,500.71
3	2024		Q7,107.10	0.711780248	Q5,058.69
4	2025		Q7,320.31	0.635518078	Q4,652.19
5	2026		Q7,539.92	0.567426856	Q4,278.35
6	2027		Q7,766.12	0.506631121	Q3,934.56
7	2028		Q7,999.10	0.452349215	Q3,618.39
8	2029		Q8,239.07	0.403883228	Q3,327.62
9	2030		Q8,486.24	0.360610025	Q3,060.22
10	2031		Q8,740.83	0.321973237	Q2,814.31
11	2032		Q9,003.06	0.287476104	Q2,588.16
12	2033		Q9,273.15	0.256675093	Q2,380.19
13	2034		Q9,551.34	0.22917419	Q2,188.92
14	2035		Q9,837.88	0.204619813	Q2,013.03
15	2036		Q10,133.02	0.182696261	Q1,851.26
16	2037		Q10,437.01	0.163121662	Q1,702.50
17	2038		Q10,750.12	0.145644341	Q1,565.69
18	2039		Q11,072.62	0.13003959	Q1,439.88
19	2040		Q11,404.80	0.116106777	Q1,324.17
20	2041		Q11,746.95	0.103666765	Q1,217.77
Promedio		Q500,696.00	Q9,000.39	VAC	Q561,193.99

^{a/} La tasa de actualización utilizada es del doce por ciento (12%)

Tabla de valor actual de los costos del proyecto. En la tabla se muestra el valor actual de los costos del proyecto. Los costos mostrados son de inversión, operación y/o funcionamiento, mantenimiento.

Costo Anual Equivalente

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ



COSTO ANUAL EQUIVALENTE

Código SNIP:	260461
Nombre del proyecto:	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA LOS LOCHUYES HACIA CASERIO LA CIENEGA EL CHOL BAJA VERAPAZ

Costo anual equivalente y Costo Beneficio								
Id	Año	Población	Acumulada	Promedio Acumulado	VAC	Factor de valor presente a anualidad	CAE	Costo - Eficiencia
						12%		
0	2021	656	1,317	656	Q500,696.00	0.13387878	Q67,032.57	Q102.18
1	2022	661	1,327	659	Q5,981.36	0.13387878	Q800.78	Q1.22
2	2023	666	1,337	661	Q5,500.71	0.13387878	Q736.43	Q1.11
3	2024	671	1,348	664	Q5,058.69	0.13387878	Q677.25	Q1.02
4	2025	676	1,358	666	Q4,652.19	0.13387878	Q622.83	Q0.93
5	2026	682	1,369	669	Q4,278.35	0.13387878	Q572.78	Q0.86
6	2027	687	1,379	671	Q3,934.56	0.13387878	Q526.75	Q0.78
7	2028	692	1,390	674	Q3,618.39	0.13387878	Q484.43	Q0.72
8	2029	698	1,400	677	Q3,327.62	0.13387878	Q445.50	Q0.66
9	2030	703	1,411	679	Q3,060.22	0.13387878	Q409.70	Q0.60
10	2031	708	1,422	682	Q2,814.31	0.13387878	Q376.78	Q0.55
11	2032	714	1,433	685	Q2,588.16	0.13387878	Q346.50	Q0.51
12	2033	719	1,444	687	Q2,380.19	0.13387878	Q318.66	Q0.46
13	2034	725	1,455	690	Q2,188.92	0.13387878	Q293.05	Q0.42
14	2035	730	1,466	693	Q2,013.03	0.13387878	Q269.50	Q0.39
15	2036	736	1,478	695	Q1,851.26	0.13387878	Q247.85	Q0.36
16	2037	742	1,489	698	Q1,702.50	0.13387878	Q227.93	Q0.33
17	2038	747	1,500	701	Q1,565.69	0.13387878	Q209.61	Q0.30
18	2039	753	1,512	704	Q1,439.88	0.13387878	Q192.77	Q0.27
19	2040	759	1,524	706	Q1,324.17	0.13387878	Q177.28	Q0.25
20	2041	765		709	Q1,217.77	0.13387878	Q163.03	Q0.23
Promedios		709			Q26,723.52	0.13387878	Q75,131.97	Q105.96

Tabla de Costo anual equivalente y costo beneficio. En la tabla se muestran los costos anuales equivalentes para cada año del periodo de diseño del proyecto y los respectivos costos eficiencia

El Costo/Beneficio del proyecto es de **Q. 105.96** que representa la división entre el Costo Anual Equivalente que corresponde a **Q. 75.131.97** y el promedio de beneficiarios en la comunidad de Aldea Los Lochuyes que asciende a **709**.
